

Aufheizprotokoll -14 Tage-

Produkt: MC-Powerscreed expert
Bauvorhaben



Objekt: Straße:

.....

..... PLZ/Ort:

Bauabschnitt / Stockwerk / Wohnung		
.....		
Auftraggeber		Estrichleger
.....	
Estricheinbau (Zeitraum)	Estrichdicke	Fußbodenheizungstyp
.....

Aufheizprotokoll für das Funktionsheizen von beschleunigten Estrichen mit MC-Powerscreed Beschleunigern für eine Belegreife von 14 Tagen.

Gemäß Schnittstellenkoordination (www.flaechenheizung.de) muss das Funktionsheizen zur Überprüfung der Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchgeführt werden. Bei Heizestrichen, die mit MC-Powerscreed Beschleunigern vergütet wurden, darf damit frühestens 3 Tage nach dem Estricheinbau begonnen werden.

Zu beachten:

- Nachtabsenkung ausschalten
- Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden
- Während der Heizphase dürfen keine Putz- und Malerarbeiten ausgeführt werden
- Während der Heizphase dürfen keine Estrichflächen abgedeckt oder zugestellt sein
- Während der Heizphase ist mindestens viermal täglich für 20-30 Minuten stoß zu lüften (keine Zugluft!)
- Nach der Heizphase ist der Estrich bei Abschaltung der Fußbodenheizung bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen
- Zur Ermittlung der Belegreife ist eine CM-Messung durchzuführen
- Vor CM-Messung & Belagsverlegung ist die Estrichtemperatur auf ca. 20 °C bzw. auf die vom Bodenbelagshersteller vorgegebene Temperatur abzusenken

Aufheizprogramm


Tag(e) nach Estricheinbau	Soll-Vorlauftemperatur	Ist-Vorlauftemperatur	Datum / Uhrzeit	Unterschrift
1	20 °C			
2	20 °C			
3	20 °C			
4	25 °C			
5	30 °C			
6	35 °C			
7	40 °C			
8	45 °C			
9	45 °C			
10	45 °C			
11	45 °C			
12	35 °C			
13	25 °C			
14	Heizung abschalten, CM-Messung bei ≤ 20 °C			

Aufheizprotokoll -14 Tage-

Produkt: MC-Powerscreed expert



14-Tage-Aufheizprogramm

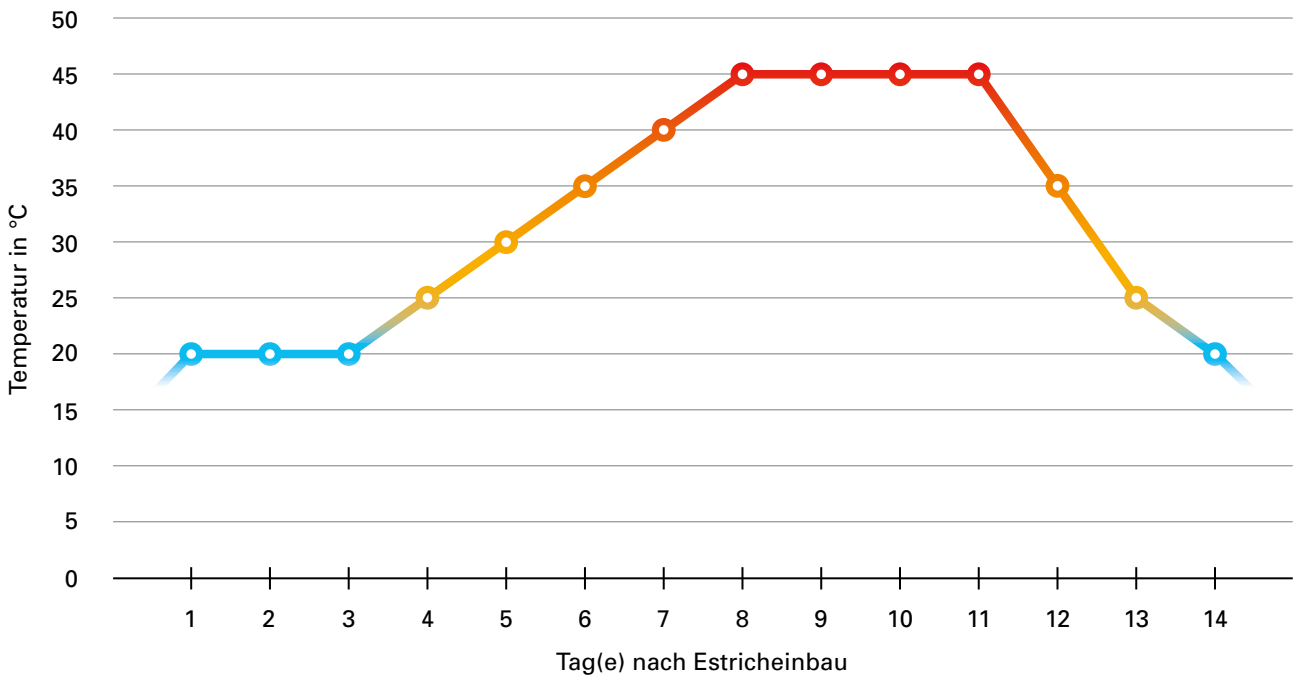

Beginn des Aufheizprotokolls:

Ende des Aufheizprotokolls:

War die Estrichfläche während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls frei von Materialien und Abdeckungen?

Ja

Nein

Wurden während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls Putz- und Malerarbeiten oder andere feuchtigkeitseintragende Gewerke ausgeführt?

Ja

Nein

Wurde während der gesamten Dauer des Aufheizprotokolls regelmäßig stoßgelüftet?

Ja

Nein

Bestätigung

Ort, Datum

Unterschrift Heizungsbauer

Unterschrift
Bauleiter / Architekt / Bauherr
